



Redegørelse

Anlægs- og Renoveringsfonden 2025



Indhold

Sammenfatning	3
1 Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden	3
2 Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden	4
2.1 Bevægelser i 2025	4
2.2 Udvikling de sidste 10 år	5
2.3 Projektstatus	6
3 Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden	7
3.1 Fordeling af projekter på hovedkonti	7
4 Økonomien for udvalgte projekter	9
4.1 Nye projekter i 2025	9
4.2 Åbne projekter over 50 mio. kr.	10
4.3 Status for de 25 største projekter	11
Bilag	13
Bilag 1 Fordeling af projekter på hovedkonti	13
Bilag 2 Projektstatus	19
Bilag 3 Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden	25

Sammenfatning

Anlægs- og Renoveringsfonden omfatter aktivitetsområde 80-89 i den årlige Finanslov.

Nærværende redegørelse for finanslovsåret 2025 er nr. 26 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2025 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 596 mio. kr. I løbet af 2025 blev der bevilget samlet 647 mio. kr. til igangværende projekter og samlet var forbruget på igangværende projekter 757 mio. kr.

Redegørelsen er opgjort eksklusiv udlån på nedenstående hovedkonti, og kan derfor ikke afstemmes direkte med Landskassens regnskab.

- 20.30.07 – Boligstøtte, renter og afdrag, netto
- 87.72.17 – Boligstøtte, selvbyggerhuse
- 87.72.23 – Boligstøtte, istandsættelsestilskud
- 89.72.11 – Støttet privat boligbyggeri

Se Tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

1 Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at smidiggøre procedurerne omkring bevilling af midler til Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til bygge- og anlægsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete bygge- og anlægsopgaver.

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond¹, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registreret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov samt Tillægsbevillingslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden eller projekter imellem, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Yderdistrikter varetager Selvstyrets centrale bygherrefunktion.

¹ Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Den centrale bygherrefunktion er opdelt i to operative enheder, således at den overordnede planlægning og prioritering af opgaverne, budget- og økonomistyring samt bygherreadministrations af nybyggeri varetages af departementets Anlægsafdeling, mens renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver varetages fra departementets Renoveringssekretariat.

2 Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

2.1 Bevægelser i 2025

Tallene i nærværende redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystem og er identiske med de tal der registreres i Landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2025 hvor "Total for redegørelsen" kan afstemmes direkte med Landskassens regnskab.

Tabel 2.1 Opgørelse af A&R fonden 2025 pr. 4. kvartal (1.000 kr.)

	Primo	Årets bevilling	Årets forbrug	Årets ændring	Ultimo
Lukkede projekter	2.927	241.126	-237.817	3.309	6.236
Projekter til intern revision	-56.343	66.816	-14.300	52.516	-3.827
Igangværende projekter	-542.625	-646.753	757.487	110.734	-431.890
Total for redegørelsen	-596.040	-338.811	505.370	166.559	-429.481
Midlertidige poster	-542	-	542	542	-
Subtotal	-596.582	-338.811	505.912	167.101	-429.481
Hovedkonto 20.30.07	-9.027	-	9.027	9.027	-
Hovedkonto 87.72.17	-7	-	-	-	-7
Hovedkonto 87.72.23	-11.527	-	-	-	-11.527
Hovedkonto 89.72.11	6.330	-	-896	-896	5.434
I alt	-610.813	-338.811	514.042	175.231	-435.582

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden (A&R fonden) dækker fra 2010 ikke hovedkonto 89.72.11 *Støttet privat boligbyggeri*. Fra 2016 dækker redegørelsen ikke hovedkonto 20.30.07 *Boligstøtte, renter og afdrag, netto*. Fra 2019 dækker redegørelsen ikke hovedkonto 87.72.17 *Boligstøtte, selvbyggerhuse* og hovedkonto 87.72.23 *Boligstøtte, istandsættelsestilskud*.

Disse hovedkonti er kun medtaget for at redegørelsen kan afstemmes med Landskassens regnskab. Alle disse hovedkonti omfatter udlånssager.


De midlertidige poster, som skyldtes differencer mellem finans- og projektmodulet i 2020, blev rettet i 3. kvartal 2025.

Primo 2025 var fondens beholdning 597 mio. kr. (ekskl. ovennævnte hovedkonti). Årets bevillinger for igangværende projekter udgjorde 647 mio. kr., mens forbruget var 757 mio. kr. Ultimo 2025 var beholdningen 429 mio. kr. – et fald på 167 mio. kr.

2.2 Udvikling de sidste 10 år


Bevillingerne igennem 2025 udgjorde samlet 647 mio. kr., mens forbruget udgjorde samlet 757 mio. kr. på igangværende projekter. Samlet er indestående i Anlægs- og Renoveringsfonden reduceret til 429 mio. kr.

Figur 1 Udvikling i bevillinger og forbrug for igangværende projekter (mio. kr.)

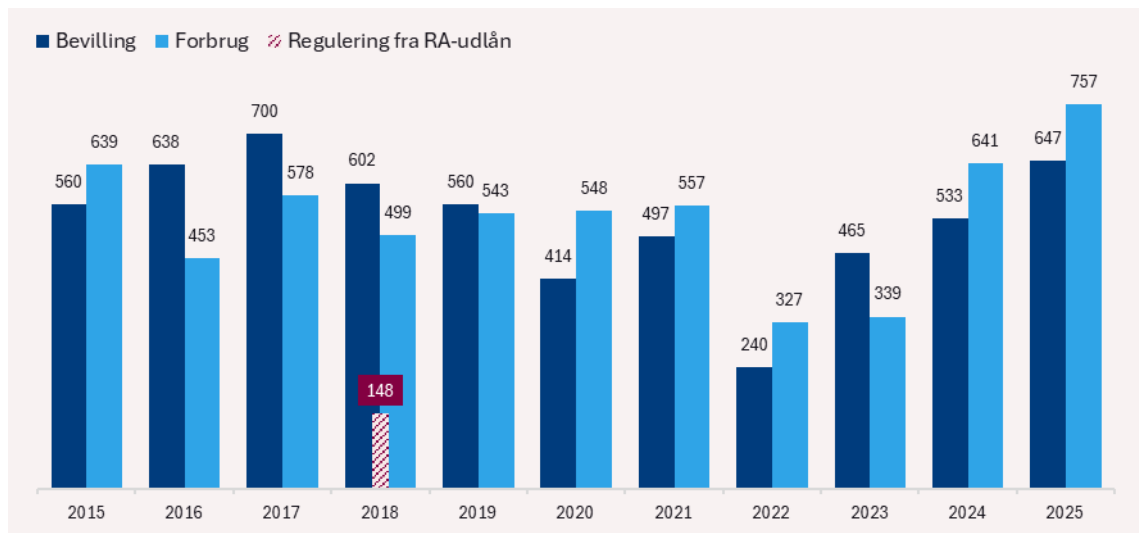

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Figur 2 Udvikling i Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning (mio. kr.)

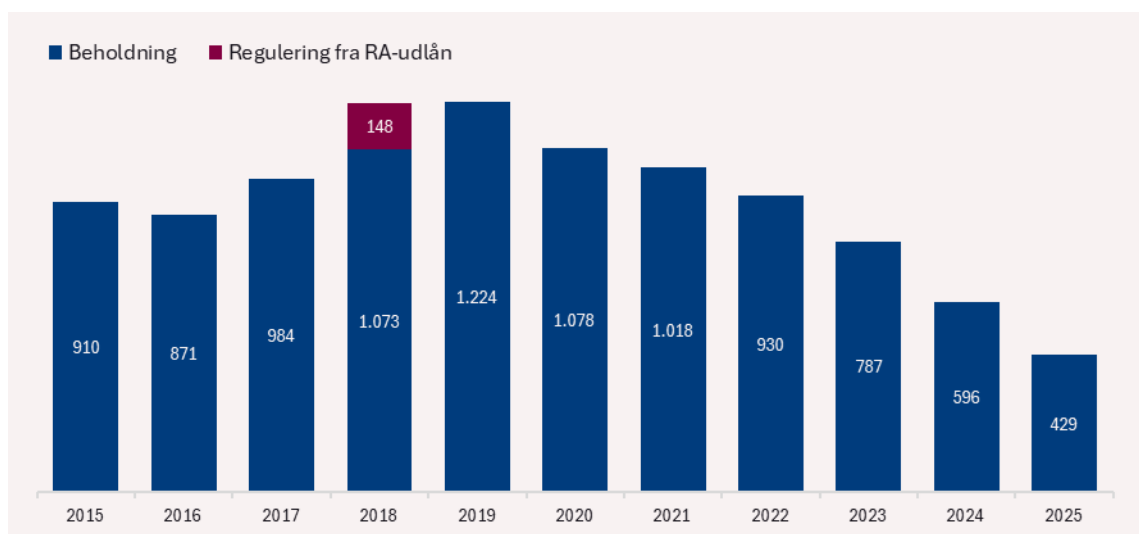

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Alle tal er opgjort eksklusivt hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto, hovedkonto 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med Landskassens regnskab.

2.3 Projektstatus

I 2025 blev der oprettet 17 nye projekter – se en detaljeret specifikation i afsnit 4.1. Der var ved udgangen af 2025 167 åbne projekter med økonomisk effekt i 2025, mens 21 projekter blev lukket. 52 projekter var i lukningsproces hos Intern Revision. Se Bilag 2 for yderligere detaljer.

Tabel 2.2 Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Igangværende	115
heraf nye	17
Til intern revision	52
Åbne projekter	167
Lukket	21
Projekter i alt	188

3 Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

3.1 Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti målt på disponible midler var

- 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
- 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg
- 84.40.15 Kollegiebyggeri
- 86.60.01 Sundhedsvæsenet
- 83.30.13 Landsdækkende institutioner

Se Bilag 1 for yderligere detaljer.

Kolonnen 'Rest til disponering' i tabel 3.1, angiver den del af projektets bevilling, der endnu ikke er indgået kontrakter på pr. 31-12-2025. Hertil skal det fremgå, at bevillingsstørrelsen tager udgangspunkt i projekternes A-overslag, hvor løbende udgifter, herunder uforudsete udgifter, administrationsomkostninger, rejseudlæg osv. inkluderes. Der disponeres til disse udgifter såfremt og når det bliver aktuelt. 'Rest til disponering' er således ikke lig med at der er ledige midler, der kan rokeres til andre formål.

Tabel 3.1 Fordeling af projekter på hovedkonti (1.000 kr.)

Hovedkonto	Nye projekter	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Forbrug i %	Rest til disponering
011014 Reserve til ny Landstingssal	-	1.413	-4.879	-3.466	3.454	-12	-1	-3.832
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut	-	1.932	-	1.932	-	1.932	-	1.704
800001 Omrokeringsreserven	-	4.051	18.829	22.880	-	22.880	-	24.456
800002 Positive samfundsøkonomiske investeringer	1	-	71.500	71.500	-60.676	10.824	-85%	-14.101
800010 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	-	2.513	-	2.513	-	2.513	-	-

Hovedkonto	Nye projekter	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Forbrug i %	Rest til disponering
811002 Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration	-	1.300	-	1.300	11.606	12.906	893%	1.300
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	-	5.540	1.300	6.840	-3.579	3.261	-52%	505
822003 IT-systemer til socialområdet	-	-1.521	6.012	4.491	-1.456	3.035	-32%	2.303
822401 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen	-	12.486	3.800	16.286	-13.629	2.656	-84%	-5.286
823001 EU-projekter vedrørende "Grøn Vækst"	-	-13.831	-	-13.831	26.271	12.440	-190%	-50.700
833012 Ældreinstitutioner	-	63.663	-6.100	57.563	10.352	67.915	18%	-22.454
833013 Landsdækkende institutioner	-	50.759	23.400	74.159	-54.812	19.347	-74%	-92.757
833014 Hjemløseindsatser	-	192	-3.900	-3.708	3.708	-	-100%	-3.708
844010 Kommunale skoler	-	2.631	-2.600	31	-	31	-	-521.763
844012 Uddannelsesbyggeri	-	30.785	42.750	73.535	-15.608	57.927	-21%	-216.185
844014 Kultur- og idrætsbyggeri	-	7.884	-4.938	2.946	-2.276	669	-77%	800
844015 Kollegiebyggeri	4	35.139	57.700	92.839	-69.109	23.730	-74%	-165.951
855020 Turisme anlæg	-	14.100	-14.000	100	-	100	-	-15.004
859001 Nye kontrolfartøjer til Grønlands Fiskerilicenskontrol	-	1.323	-1.437	-114	-	-114	-	-0
866001 Sundhedsvæsenet	-	31.210	54.823	86.033	-149.260	-63.228	-173%	-335.200
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter	-	5.582	-	5.582	-340	5.242	-6%	-37.807
871106 5-års eftersyn	-	803	500	1.303	-646	657	-50%	-1.231
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser	-	9.524	-1.500	8.024	-3.686	4.337	-46%	1.283
871110 Særlige undersøgelser på anlægsområdet	-	3.000	-1.000	2.000	-221	1.779	-11%	-
877002 Køb af administrationsbygning	-	2.182	-	2.182	-1.741	441	-80%	-27.048
877210 Personaleboliger i Nuuk	-	21.719	-18.352	3.367	-5	3.362	-0%	1
877213 Særlig renovering	-	6.194	-	6.194	-5.932	261	-96%	-30.310
877222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	-	-2.736	-	-2.736	-	-2.736	-	-52.386
877312 Reinvestering i havne og kajanlæg	-	41.022	114.078	155.100	-95.630	59.471	-62%	-702
877320 Udbygning af landingsbanestruktur	-	7.158	700	7.858	-404	7.454	-5%	7.384
877322 GLV - landingspladser	-	4.205	-78.175	-73.970	73.895	-75	-100%	-151.610
877501 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	-	-2.240	5.000	2.760	-2.720	40	-99%	40
877503 Tilskud til kommunale miljøanlæg	-	2.439	-2.400	39	-	39	-	39
877504 Asiaq	-	-12	-	-12	-	-12	-	-12
897140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	1	-	-58.000	-58.000	60.000	2.000	-103%	-158.900
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	11	245.634	135.700	381.334	-212.925	168.409	-56%	-751.050
I alt	17	596.040	338.811	934.851	-505.370	429.481	-54%	-2.618.182

4 Økonomien for udvalgte projekter

4.1 Nye projekter i 2025

Der blev oprettet 17 nye projekter med samlede bevillinger på 270 mio. kr.

Tabel 4.1 Nye projekter i 2025 (1.000 kr.)

Finanslov	Projekt	Årets bevilling	Årets forbrug
800002	52126 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	71.500	-60.676
844015	52120 Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2	5.200	-8.211
844015	52121 Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2	5.200	-9.868
844015	52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	20.800	-38.701
844015	52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	1.500	-18.011
897140	17782 Udlån til Nukissiorfiit, 2025	60.000	-60.000
897212	32149 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq	5.300	-4.877
897212	32151 Ungdomsboliger, Nuussuaq	300	-2.667
897212	32154 Ungdomsboliger, Narsaq	3.300	-6.778
897212	32155 Ungdomsboliger, Upernavik Etape 2	2.100	-5.772
897212	32157 Lejeboliger, Qaanaaq	3.700	-3.481
897212	32158 Lejeboliger, Upernavik	2.800	-1.565
897212	32160 Ungdomsboliger, Kullorsuaq	3.000	-1.580
897212	32161 Ungdomsboliger, Sarfannguit	1.300	-470
897212	32163 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit Etape 2	4.000	-2.615
897212	32164 Ungdomsboliger, Narsaq Etape 2	6.100	-3.879
897212	34530 Renoveringsindsats - Sammen om Sunde Boliger	74.200	-57.027
I alt		270.300	-286.181

4.2 Åbne projekter over 50 mio. kr.

22 åbne projekter havde ultimo 2025 en samlet bevilling på over 50 mio. kr. Se Bilag 1 og Bilag 2 for yderligere detaljer.

Tabel 4.2 Åbne projekter med bevilling på over 50 mio. kr. (1.000 kr.)

Projekt	Finanslov	Bevilling t.o.m indeværende år	Forbrug t.o.m indeværende år	Rest til disponering	Ultimo
52126 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	800002	71.500	-60.676	-14.101	10.824
40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	60.400	-48.190	12.227	12.210
40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-61.438	3.386	3.582
52118 Diverse renovering	844012	124.800	-93.190	20.312	31.610
52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	56.100	-51.850	2.868	4.250
52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	59.900	-55.686	2.980	4.214
52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	87.850	-84.855	2.048	2.995
52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	216.500	-239.198	-23.726	-22.698
52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	66.950	-70.131	-4.030	-3.181
52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	844015	94.400	-71.079	5.388	23.321
47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	124.478	-115.190	7.757	9.288
47051 Apparaturløbet	866001	147.875	-136.330	11.522	11.545
47053 Vedligeholdelseefterslæb	866001	223.900	-229.561	19.414	-5.661
23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	54.835	-51.449	546	3.386
24116 Reinvestering i havne og kajanlæg	877312	269.669	-236.659	21.927	33.010
24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	877312	114.000	-95.395	7.019	18.605
61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	225.000	-224.960	40	40
17782 Udlån til Nukissiorfiit, 2025	897140	60.000	-60.000	60.000	-
30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	56.900	-52.907	3.034	3.993
31037 Skimmel renovering	897212	85.200	-87.786	-8.476	-2.586
34527 Diverse renovering og sanering	897212	534.955	-480.984	38.400	53.971
34530 Renoveringsindsats - Sammen om Sunde Boliger	897212	74.200	-57.027	-4.830	17.173
I alt		2.874.432	-2.664.540	163.702	209.892

4.3 Status for de 25 største projekter

Nedenfor fremgår status for de 25 største projekter målt på samlet bevilling ultimo 2025. Disse projekter er endnu ikke sendt til Intern Revision.

Tabel 4.3 Status for de 25 største projekter målt på samlet bevilling (1.000 kr.)

Projekt	Finanslov	Bevilling t.o.m indeværende år	Forbrug t.o.m indeværende år	Status
34527 Diverse renovering og sanering	897212	534.955	-480.984	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	269.669	-236.659	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse
61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	225.000	-224.960	Projektet er afsluttet og lukkes i 2026.
47053 Vedligeholdelse efter slæb	866001	223.900	-229.561	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – herunder særligt rådgivningsopgaver i forbindelse med udbygning af landets infrastruktur
52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	216.500	-239.198	Opførelse af Handicapinstitutionen Sungiusarfik Ikinngut er afsluttet, og der er gennemført 1 års aflevering. Lukning af projektet sker i 2026.
47051 Apparaturløjen	866001	147.875	-136.330	Projektet er en puljebestilling til indkøb af apparatur til sundhedsvæsenet. Herunder indkøb for såvel fornyelse, udvidelse, reparation og vedligehold.
52118 Diverse renovering	844012	124.800	-93.190	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til behov og ønsker fra uddannelsesinstitutionerne udbydes løbende.
47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	124.478	-115.190	Om- og tilbygning af Sisimiut sygehus er opstartet i 2022, hvor der er konstateret forsinkelser under udførelse. Forventes afsluttet i 2026.
24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	877312	114.000	-95.395	Renovering af havnefaciliteterne følger tidsplanen og forventes afsluttet i henhold til kontraktens afleveringstermin.
52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	844015	94.400	-71.079	Opførelse af kollegier Etape 2 i Sisimiut er opstartet i 2024, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	87.850	-84.855	Projektet er afsluttet med mindre forsinkelser i udarbejdelse af byggeregnskab. Forventes lukket i 2026.
31037 Skimmel renovering	897212	85.200	-87.786	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af 'smilende boliger' konceptet (totalrenovering) i Selvstyrets boliger der står i tomgang pga. skimmel.

Projekt	Finanslov	Bevilling t.o.m indeværende år	Forbrug t.o.m indeværende år	Status
				Opgaverne udbydes løbende i underhåndbud, for at imødekomme behov for beskæftigelse i branchen. Tillige kan der afholdes over bevillingen tilskud til INI A/S for udbedring af mindre skimmels opgaver.
34530 Renoveringsindsats - Sammen om Sunde Boliger	897212	74.200	-57.027	Projektet er en puljebestilling til gennemførelse af renoveringsindsatsen Sammen om Sunde Boliger, iht. indsatsens udførelses- og finansieringsplan.
52126 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	800002	71.500	-60.676	Opførelse af kollegier Etape 2 i Nuuk er opstartet i 2024, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	66.950	-70.131	Projektet er afsluttet med mindre forsinkelser i udarbejdelse af byggerenskab. Forventes lukket i 2026.
40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-61.438	Opførelse af Handicapinstitutionen Sungiusarfik Ikinngut er afsluttet, og der er gennemført 1 års aflevering. Lukning af projektet sker i 2026.
40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	60.400	-48.190	Opførelse af enhed til Aaqa i Nuuk er opstartet i 2024, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
17782 Udlån til Nukissiorfiit, 2025	897140	60.000	-60.000	Anlægsudlån til Nukissiorfiit udbetales efter anmodning fra virksomheden.
52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	59.900	-55.686	Projektet er afsluttet med mindre forsinkelser i udarbejdelse af byggerenskab. Forventes lukket i 2026.
30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	56.900	-52.907	Opførelse af 60 boliger (20 boliger Selvstyret + 40 boliger Kommune Qeqertalik i Aasiaat er opstartet i 2021. 1-års gennemgang pågår.
52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	56.100	-51.850	Projektet er afsluttet med mindre forsinkelser i udarbejdelse af byggerenskab. Forventes lukket i 2026.
23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	54.835	-51.449	
52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	844015	49.600	-44.481	Opførelse af kollegier Etape 2 i Qaqortoq er opstartet i 2024, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
46021 Psykiatribygning i Nuuk	866001	49.200	-98.281	Opførelse af ny psykiatribygning + amulancegarage og portørcenter er opstartet i 2025, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	833013	47.200	-41.438	Opførelse af ny døgninstitution for børn med sindslidelser er opstartet i 2024, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
I alt		3.020.432	-2.848.741	

Bilag

Bilag 1 Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
011014	10019 Udvidelse af Landstingssal	-75	-3.379	-3.454	3.454	-	-	-	-3.454	-100%
011014	10053 Ny bygning til Inatsisatut	1.488	-1.500	-12	-	-12	1.500	-1.512	-1.878	-
011015	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	1.932	-	1.932	-	1.932	6.000	-4.068	-4.296	-
800001	80800 Omrokeringsreserve	4.051	18.829	22.880	-	22.880	24.456	-1.576	-	-
800002	52126 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	-	71.500	71.500	-60.676	10.824	71.500	-60.676	-85.601	-85%
800010	80801 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513	-	2.513	-	2.513	-	2.513	-	-
811002	10054 Selvstyrets Central Administration	1.300	-	1.300	-	1.300	1.300	-	-	-
811002	10058 Ombygning af ASA	-	-	-	11.606	11.606	-	11.606	-	-
822002	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	743	-700	43	-	43	77.242	-77.199	-77.199	-
822002	90028 Udvikling af ERP	1.648	2.000	3.648	-1.547	2.101	7.000	-4.899	-7.486	-42%
822002	90029 Nyt Lånemodul	3.149	-	3.149	-2.032	1.117	6.500	-5.383	-5.552	-65%
822003	40088 Ny Jobportal	334	4.873	5.207	-683	4.524	5.373	-849	-849	-13%
822003	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	-1.490	-	-1.490	-	-1.490	11.000	-12.490	-12.559	-
822003	40094 Offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse	-365	1.139	774	-774	0	8.739	-8.739	-9.401	-100%
822401	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	2.724	3.800	6.524	-4.514	2.010	23.700	-21.690	-29.632	-69%
822401	90025 Beskæftigelsesfradrag	5.883	-	5.883	-5.883	-	11.400	-11.400	-11.400	-100%
822401	90027 Krops- og narkoskannere	3.879	-	3.879	-3.232	646	4.000	-3.354	-3.354	-83%
823001	10055 Grøn vækst - indbetaling fra EU	-	-	-	50.289	50.289	-	50.289	-	-
823001	10056 Budgetstøtte - projektoversigt	-13.831	-	-13.831	-24.018	-37.849	-	-37.849	-50.700	174%
833012	44044 Renovering og tilbygning alderdomshjem, Nanortalik	1.742	-1.700	42	-	42	11.875	-11.833	-11.833	-
833012	44047 Alderdomshjem i Paamiut	2.231	-2.200	31	-	31	25.300	-25.269	-25.269	-
833012	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	12.400	15.800	28.200	-	28.200	28.200	-	-	-
833012	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	2.897	-	2.897	-	2.897	16.350	-13.453	-15.511	-
833012	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	-19	-18.000	-18.019	18.019	-	-	-	-18.019	-100%
833012	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	3.867	-	3.867	-	3.867	16.400	-12.533	-16.400	-
833012	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	-460	-	-460	-	-460	-	-460	-460	-
833012	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	41.005	-	41.005	-7.667	33.338	42.700	-9.362	-42.700	-19%
833013	40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	10.008	21.800	31.808	-19.598	12.210	60.400	-48.190	-48.173	-62%

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
833013	40067 Pulje til nyanlæg og renovering	-71	-	-71	-	-71	20	-91	-91	-
833013	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	3.794	-	3.794	-212	3.582	65.020	-61.438	-61.634	-6%
833013	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	23.480	10.600	34.080	-28.318	5.762	47.200	-41.438	-49.262	-83%
833013	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	191	-	191	-	191	7.000	-6.809	-6.809	-
833013	40091 Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	4.357	-	4.357	-6.684	-2.328	34.500	-36.828	-37.557	-153%
833013	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	9.000	-9.000	-	-	-	-	-	-	-
833014	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	192	-3.900	-3.708	3.708	-	-	-	-3.708	-100%
844010	50126 Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	2.631	-2.600	31	-	31	11.100	-11.069	-11.333	-
844012	15005 Køb af gård i Narsap Ilua	-	8.750	8.750	-	8.750	8.750	-	-	-
844012	51024 Jern- og Metalskolen i Sisimiut	8.953	-	8.953	-1.716	7.237	10.000	-2.763	-3.455	-19%
844012	51026 Landbrugsskole i Upernaviarsuk	2.532	-2.300	232	-	232	700	-468	-796	-
844012	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-3.425	3.400	-25	-	-25	23.091	-23.116	-22.992	-
844012	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	707	-700	7	-	7	35.800	-35.793	-35.793	-
844012	52100 Skole for selvforsyning	777	-800	-23	-	-23	200	-223	-304	-
844012	52118 Diverse renovering	14.175	31.200	45.375	-13.765	31.610	124.800	-93.190	-104.488	-30%
844012	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	7.066	-	7.066	-3	7.063	8.000	-937	-1.091	-0%
844012	52125 Renovering af Kunstsolen i Nuuk	-	1.200	1.200	-123	1.077	1.200	-123	-1.179	-10%
844012	52127 Ombygning af landbrugsskolen i Narsaq	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
844014	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	7.884	-5.738	2.146	-1.476	669	16.562	-15.893	-16.562	-69%
844014	54009 Opbevaringsfaciliteter til Grønlands Museum og Arkiv	-	800	800	-800	-	800	-800	-	-100%
844015	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassiarsuk	4.081	-	4.081	-238	3.843	20.700	-16.857	-21.049	-6%
844015	52102 Projektering af standardkollegier	4.149	-	4.149	-300	3.849	7.100	-3.251	-3.251	-7%
844015	52111 32 sengepladser, Aasiaat	3.967	-	3.967	283	4.250	56.100	-51.850	-53.232	7%
844015	52112 70 sengepladser, Ilulissat	4.346	-	4.346	-132	4.214	59.900	-55.686	-56.920	-3%
844015	52113 72 sengepladser, Sisimiut	6.024	-	6.024	-3.029	2.995	87.850	-84.855	-85.802	-50%
844015	52114 219 sengepladser, Nuuk	-45.603	25.000	-20.603	-2.096	-22.698	216.500	-239.198	-240.226	10%
844015	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	-2.958	-	-2.958	-223	-3.181	66.950	-70.131	-70.980	8%
844015	52120 Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2	3.857	5.200	9.057	-8.211	846	27.900	-27.054	-27.201	-91%
844015	52121 Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2	5.875	5.200	11.075	-9.868	1.207	27.400	-26.193	-26.424	-89%
844015	52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	41.222	20.800	62.022	-38.701	23.321	94.400	-71.079	-89.012	-62%
844015	52123 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	-11.452	-	-11.452	11.418	-34	7.600	-7.634	-7.634	-100%
844015	52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	21.630	1.500	23.130	-18.011	5.119	49.600	-44.481	-47.787	-78%
855020	72004 Etablering af Visitorcentre	9.000	-9.000	0	-	0	1.300	-1.300	-1.404	-

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
855020	72010 Nuuk Natur- og geopark	9.750	-9.700	50	-	50	50	-	-	-
855020	72011 Nationale seværdigheder	-4.650	4.700	50	-	50	50	-	-	-
859001	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK	1.323	-1.437	-114	-	-114	5.063	-5.177	-5.063	-
866001	46021 Psykiatribygning i Nuuk	12.540	-	12.540	-61.621	-49.081	49.200	-98.281	-134.814	-491%
866001	46023 Energioptimering DIH, Nuuk	0	-7.000	-7.000	7.000	-	-	-	-7.000	-100%
866001	46031 Projektering af ny sengeløj og patienthotel	6.116	-	6.116	-16	6.100	13.000	-6.900	-7.700	-0%
866001	46032 Rømning af byggegrund	3.000	-3.000	-	-	-	-	-	-	-
866001	46033 Steno Diabetes Center	-43.813	3.000	-40.813	-16.947	-57.760	3.000	-60.760	-117.692	42%
866001	46034 Anskaffelser af ambulancer	3.129	2.500	5.629	-	5.629	15.000	-9.371	-9.371	-
866001	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	215	-6.000	-5.786	5.786	-	-	-	-5.786	-100%
866001	46037 Tilskud til Neriuffik	-34	-1.500	-1.534	1.534	-	-	-	-1.534	-100%
866001	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	-136	-	-136	-	-136	53.428	-53.564	-53.564	-
866001	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.827	-2.827	-0	-	-0	3.673	-3.673	-3.673	-
866001	47042 Regionssygehus i Sisimiut	37.853	10.300	48.153	-38.865	9.288	124.100	-114.812	-116.721	-81%
866001	47051 Apparaturpuljen	11.220	13.500	24.720	-13.174	11.545	147.875	-136.330	-136.353	-53%
866001	47053 Vedligeholdelseefterslæb	-10.086	29.500	19.414	-25.075	-5.661	223.900	-229.561	-204.486	-129%
866001	47055 Diverse nyanlæg og renovering	4	-150	-146	146	-	-	-	-146	-100%
866001	47061 Sundhedsvæsenets standard indkvartering	1.748	-	1.748	-1.516	233	2.500	-2.267	-2.267	-87%
866001	48013 Centratklinik i Nuuk	6.033	-	6.033	-2.518	3.515	9.218	-5.703	-6.927	-42%
866001	90030 Nyt EPJ-System	596	16.500	17.096	-3.993	13.102	18.500	-5.398	-7.206	-23%
870088	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	2.013	-	2.013	-	2.013	5.000	-2.987	-4.902	-
870088	29109 Lufthavnsvej i Qaanaaq	3.569	-	3.569	-340	3.229	6.000	-2.771	-4.312	-10%
871106	73016 5-års eftersyn	803	500	1.303	-646	657	2.500	-1.843	-1.946	-50%
871109	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	3.791	-	3.791	-404	3.386	54.835	-51.449	-54.289	-11%
871109	23012 Infrastrukturanlæg i Sydgrønland	1.932	-1.500	432	-105	328	500	-172	-172	-24%
871109	23013 Vækst- og udviklingsanalyse	3.801	-	3.801	-3.178	623	6.000	-5.377	-5.590	-84%
871110	20077 Klimatilpasningsplan for byggeri og infrastruktur	1.000	-1.000	-	-	-	-	-	-	-
871110	20078 DGNB Bæredygtighedscertificeringsordning	2.000	-	2.000	-221	1.779	2.000	-221	-2.000	-11%
877002	21001 Køb af B-4275, borekernelager	2.182	-	2.182	-1.741	441	25.200	-24.759	-25.178	-80%
877210	30012 Personaleboliger i Nuuk	21.719	-18.352	3.367	-5	3.362	14.148	-10.786	-14.147	-0%
877213	97157 Bevaringsværdige bygninger	6.194	-	6.194	-5.932	261	18.000	-17.739	-17.083	-96%
877222	35026 Boligprg./bygder og yderd. 2016	-6.236	-	-6.236	-	-6.236	18	-6.254	-6.254	-
877222	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500	-	3.500	-	3.500	3.500	-	-3.500	-

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
877312	24116 Reinvestering i havne og kajanlæg	23.524	24.700	48.224	-15.213	33.010	269.669	-236.659	-247.742	-32%
877312	24122 Sektorplaner for havne	-0	-100	-100	100	-	-	-	-100	-100%
877312	24128 Diverse nyanlæg	18	-222	-204	204	-	-	-	-204	-100%
877312	24129 Havn i Kangerlussuaq	3.328	-3.300	28	-	28	700	-672	-854	-
877312	24131 Havnefaciliteter i Uummanaq	738	-700	38	-	38	31.400	-31.362	-31.675	-
877312	24136 Etablering af anløbsfaciliteter	679	-700	-21	-	-21	3.450	-3.471	-3.747	-
877312	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	2.402	-	2.402	-121	2.281	2.500	-219	-357	-5%
877312	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	3.858	93.900	97.758	-79.152	18.605	114.000	-95.395	-106.981	-81%
877312	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	4.678	-	4.678	-180	4.498	19.400	-14.902	-16.957	-4%
877312	24141 Havnefyrr	1.798	500	2.298	-1.267	1.031	11.400	-10.369	-10.793	-55%
877320	25201 Kangerlussuaq	849	-800	49	-	49	200	-151	-151	-
877320	25216 Tasiilaq, landingsbane	2.541	-	2.541	-109	2.433	4.000	-1.567	-1.573	-4%
877320	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	2.268	-	2.268	-188	2.079	2.900	-821	-827	-8%
877320	25218 Anlæggelse af regionale baner	1.500	1.500	3.000	-107	2.893	3.000	-107	-107	-4%
877322	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	-84	-27.075	-27.160	27.160	-	-	-	-27.160	-100%
877322	25183 Langsigtede investeringsbehov	1.389	-1.400	-11	-	-11	48.600	-48.611	-49.694	-
877322	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.091	-1.100	-9	-	-9	3.400	-3.409	-4.211	-
877322	25207 Helikopterflyvepladser	102	-5.000	-4.898	4.898	-	-	-	-4.898	-100%
877322	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	695	-700	-5	-	-5	3.200	-3.205	-3.654	-
877322	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	34	-5.900	-5.866	5.866	-	-	-	-5.866	-100%
877322	25213 Hangar til helikopter	920	-900	20	-70	-50	25.100	-25.150	-25.150	-347%
877322	25214 Hangar til Tasiilaq	5	-29.300	-29.295	29.295	-	-	-	-29.295	-100%
877322	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq	54	-6.800	-6.746	6.746	-	-	-	-6.746	-100%
877501	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	-2.240	5.000	2.760	-2.720	40	225.000	-224.960	-224.960	-99%
877503	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	2.439	-2.400	39	-	39	42.100	-42.061	-42.061	-
877504	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	-12	-	-12	-	-12	1.700	-1.712	-1.712	-
897140	17780 Udlån til Nukissiorfiit, 2023	-	-60.000	-60.000	60.000	-	-	-	-	-100%
897140	17781 Udlån til Nukissiorfiit, 2024	-	-60.000	-60.000	60.000	-	-	-	-	-100%
897140	17782 Udlån til Nukissiorfiit, 2025	-	60.000	60.000	-60.000	-	60.000	-60.000	-	-100%
897140	21078 Drikkevandsforsyning, Ilulissat	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
897212	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	2.471	-2.500	-29	-	-29	77.210	-77.239	-80.269	-
897212	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	2.094	-2.100	-6	-	-6	60.100	-60.106	-60.106	-
897212	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	-519	500	-19	-	-19	29.300	-29.319	-29.396	-

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
897212	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	5.844	-	5.844	-1.851	3.993	56.900	-52.907	-53.866	-32%
897212	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	288	-	288	-46	242	1.200	-958	-1.007	-16%
897212	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	-45	-	-45	-	-45	21.500	-21.545	-21.545	-
897212	31031 Diverse nedrivning Narsaq	5.017	-	5.017	-121	4.896	16.000	-11.104	-11.351	-2%
897212	31032 Diverse nedrivning Paamiut	11.815	5.000	16.815	-17.706	-890	42.900	-43.790	-43.002	-105%
897212	31033 Diverse nedrivning Nuuk	8	-	8	-	8	12.300	-12.292	-12.292	-
897212	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	3.452	-	3.452	-258	3.194	27.400	-24.206	-24.352	-7%
897212	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	1.016	-1.000	16	-	16	6.800	-6.784	-6.784	-
897212	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	1.770	-	1.770	-	1.770	6.094	-4.324	-4.324	-
897212	31037 Skimmel renovering	-507	8.000	7.493	-10.079	-2.586	85.200	-87.786	-93.676	-135%
897212	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	124	-	124	-	124	2.900	-2.776	-2.776	-
897212	31042 Diverse nedrivning Qasigiannnguit	-34	-3.700	-3.734	3.734	-	-	-	-3.734	-100%
897212	31043 Landsdækkende skimmelrenovering	6.171	1.000	7.171	-241	6.930	36.000	-29.070	-31.950	-3%
897212	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	-67	-100	-167	167	-	-	-	-167	-100%
897212	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	4.070	-4.100	-30	-	-30	78.300	-78.330	-78.330	-
897212	31049 Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	-656	700	44	-	44	11.800	-11.756	-11.756	-
897212	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	2.382	-2.400	-18	-	-18	14.300	-14.318	-15.788	-
897212	31051 Renovering af altaner, Paamiut	469	-	469	-	469	11.400	-10.931	-10.931	-
897212	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	2.633	-2.600	33	-	33	17.200	-17.167	-17.167	-
897212	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	2.604	-2.600	4	-	4	12.400	-12.396	-12.396	-
897212	31058 Skimmel renovering, Qaqortoq	-2.654	1.500	-1.154	-465	-1.620	8.500	-10.120	-10.209	40%
897212	31059 Skimmel renovering, Maniitsoq	2.591	1.500	4.091	-147	3.945	8.500	-4.555	-4.689	-4%
897212	31060 Skimmel renovering, Sisimiut	10.641	7.000	17.641	-6.026	11.615	31.000	-19.385	-21.717	-34%
897212	31062 Skimmel renovering, Aasiaat	4.364	1.000	5.364	-121	5.243	5.500	-257	-395	-2%
897212	31063 Skimmel renovering, Ilulissat	4.812	-	4.812	-121	4.690	5.000	-310	-447	-3%
897212	31064 Nedrivning af BSU-huse	3.824	-	3.824	-597	3.227	8.200	-4.973	-5.045	-16%
897212	31065 Renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk	-1.762	1.800	38	-	38	18.200	-18.162	-18.452	-
897212	31066 Fornyelse af installationer i flere byer	-2.294	-800	-3.094	3.061	-32	44.400	-44.432	-44.432	-99%
897212	31068 Lejeboliger, Upernavik	1.500	-1.500	-	-	-	-	-	-	-
897212	31069 Lejeboliger, Uummannaq	1.500	-1.500	-	-	-	-	-	-	-
897212	32124 Boliger	5.190	200	5.390	-42	5.348	32.340	-26.992	-27.650	-1%
897212	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.033	-12.000	33	-	33	14.700	-14.667	-14.667	-
897212	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	17.913	-	17.913	-	17.913	18.000	-87	-87	-

Finanslov	Projekt	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret	Årets forbrug i % af diponibel
897212	32140 Ungdomsboliger - typehus	160	-	160	-	160	2.300	-2.140	-2.140	-
897212	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	340	-	340	-	340	16.100	-15.760	-15.760	-
897212	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	201	500	701	-273	428	17.333	-16.905	-19.276	-39%
897212	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	723	200	923	-69	855	10.133	-9.278	-9.766	-7%
897212	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit	1.169	800	1.969	-1.789	180	8.933	-8.753	-9.038	-91%
897212	32145 Ungdomsboliger, Uummannaq	5.686	-	5.686	-4.408	1.277	18.333	-17.056	-17.293	-78%
897212	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	1.562	-	1.562	-950	612	17.134	-16.522	-16.874	-61%
897212	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit	2.320	1.200	3.520	-1.424	2.097	11.234	-9.137	-10.209	-40%
897212	32149 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq	1.246	5.300	6.546	-4.877	1.669	10.200	-8.531	-9.917	-74%
897212	32150 Ungdomsboliger, Nanortalik	5.363	3.400	8.763	-4.880	3.884	10.000	-6.116	-9.798	-56%
897212	32151 Ungdomsboliger, Nuussuaq	3.588	300	3.888	-2.667	1.221	5.100	-3.879	-5.090	-69%
897212	32152 Ungdomsboliger, Kangaamiut	1.148	-	1.148	-59	1.088	1.500	-412	-548	-5%
897212	32153 Ungdomsboliger, Tasiilaq Etape 2	1.282	-	1.282	-78	1.203	1.300	-97	-97	-6%
897212	32154 Ungdomsboliger, Narsaq	5.999	3.300	9.299	-6.778	2.521	10.000	-7.479	-9.802	-73%
897212	32155 Ungdomsboliger, Upernavik Etape 2	3.889	2.100	5.989	-5.772	216	7.600	-7.384	-7.574	-96%
897212	32157 Lejeboliger, Qaanaaq	1.764	3.700	5.464	-3.481	1.983	11.100	-9.117	-11.120	-64%
897212	32158 Lejeboliger, Upernavik	1.048	2.800	3.848	-1.565	2.283	4.300	-2.017	-8.258	-41%
897212	32159 Lejeboliger, Uummannaq	420	1.500	1.920	-2.738	-818	3.000	-3.818	-8.039	-143%
897212	32160 Ungdomsboliger, Kullorsuaq	-24	3.000	2.977	-1.580	1.397	3.000	-1.603	-2.694	-53%
897212	32161 Ungdomsboliger, Sarfannguit	-22	1.300	1.279	-470	808	1.300	-492	-566	-37%
897212	32162 Ungdomsboliger, Paamiut	-19	1.300	1.282	-351	931	1.300	-369	-590	-27%
897212	32163 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit Etape 2	-24	4.000	3.977	-2.615	1.361	4.000	-2.639	-4.303	-66%
897212	32164 Ungdomsboliger, Narsaq Etape 2	-18	6.100	6.082	-3.879	2.203	6.100	-3.897	-6.257	-64%
897212	34527 Diverse renovering og sanering	128.227	-	128.227	-74.255	53.971	534.955	-480.984	-496.555	-58%
897212	34530 Renoveringsindsats - Sammen om Sunde Boliger	-	74.200	74.200	-57.027	17.173	74.200	-57.027	-79.030	-77%
897212	38019 Udvikling af Illorput 2023	508	-	508	-80	428	2.000	-1.572	-1.637	-16%
897212	39041 Genhusning efter oversvømmelse	-29.392	29.400	8	-	8	110.954	-110.946	-110.946	-
897212	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	432	-	432	-	432	23.100	-22.668	-22.668	-
I alt		596.040	338.811	934.851	-505.370	429.481	5.009.008	-4.579.527	-5.047.457	-54%

Bilag 2 Projektstatus

Projektstadi	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
Til intern revision	10053 Ny bygning til Inatsisatut	011014	1.488	-1.500	-12	-	-12	1.500	-1.512	-1.878
Til intern revision	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	743	-700	43	-	43	77.242	-77.199	-77.199
Til intern revision	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	822003	-1.490	-	-1.490	-	-1.490	11.000	-12.490	-12.559
Til intern revision	44044 Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	833012	1.742	-1.700	42	-	42	11.875	-11.833	-11.833
Til intern revision	44047 Alderdomshjem i Paamiut	833012	2.231	-2.200	31	-	31	25.300	-25.269	-25.269
Til intern revision	40067 Pulje til nyanlæg og renovering	833013	-71	-	-71	-	-71	20	-91	-91
Til intern revision	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	833013	191	-	191	-	191	7.000	-6.809	-6.809
Til intern revision	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	833013	9.000	-9.000	-	-	-	-	-	-
Til intern revision	50126 Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	844010	2.631	-2.600	31	-	31	11.100	-11.069	-11.333
Til intern revision	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	-3.425	3.400	-25	-	-25	23.091	-23.116	-22.992
Til intern revision	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	707	-700	7	-	7	35.800	-35.793	-35.793
Til intern revision	52123 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	844015	-11.452	-	-11.452	11.418	-34	7.600	-7.634	-7.634
Til intern revision	72004 Etablering af Visitorcentre	855020	9.000	-9.000	0	-	0	1.300	-1.300	-1.404
Til intern revision	72010 Nuuk Natur- og geopark	855020	9.750	-9.700	50	-	50	50	-	-
Til intern revision	72011 Nationale seværdigheder	855020	-4.650	4.700	50	-	50	50	-	-
Til intern revision	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK	859001	1.323	-1.437	-114	-	-114	5.063	-5.177	-5.063
Til intern revision	46032 Rømning af byggegrund	866001	3.000	-3.000	-	-	-	-	-	-
Til intern revision	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	866001	-136	-	-136	-	-136	53.428	-53.564	-53.564
Til intern revision	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	866001	2.827	-2.827	-0	-	-0	3.673	-3.673	-3.673
Til intern revision	23012 Infrastrukturanlæg i Sydgrønland	871109	1.932	-1.500	432	-105	328	500	-172	-172
Til intern revision	20077 Klimatilpasningsplan for byggeri og infrastruktur	871110	1.000	-1.000	-	-	-	-	-	-
Til intern revision	30012 Personaleboliger i Nuuk	877210	21.719	-18.352	3.367	-5	3.362	14.148	-10.786	-14.147
Til intern revision	24129 Havn i Kangerlussuaq	877312	3.328	-3.300	28	-	28	700	-672	-854
Til intern revision	24131 Havnefaciliteter i Uummannaq	877312	738	-700	38	-	38	31.400	-31.362	-31.675
Til intern revision	24136 Etablering af anløbsfacilitetter	877312	679	-700	-21	-	-21	3.450	-3.471	-3.747
Til intern revision	25201 Kangerlussuaq	877320	849	-800	49	-	49	200	-151	-151
Til intern revision	25183 Langsigtede investeringsbehov	877322	1.389	-1.400	-11	-	-11	48.600	-48.611	-49.694
Til intern revision	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	877322	1.091	-1.100	-9	-	-9	3.400	-3.409	-4.211
Til intern revision	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	877322	695	-700	-5	-	-5	3.200	-3.205	-3.654
Til intern revision	25213 Hangar til helikopter	877322	920	-900	20	-70	-50	25.100	-25.150	-25.150
Til intern revision	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	877503	2.439	-2.400	39	-	39	42.100	-42.061	-42.061

Projektstadiet	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
Til intern revision	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	877504	-12	-	-12	-	-12	1.700	-1.712	-1.712
Til intern revision	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	2.471	-2.500	-29	-	-29	77.210	-77.239	-80.269
Til intern revision	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	2.094	-2.100	-6	-	-6	60.100	-60.106	-60.106
Til intern revision	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	897212	-519	500	-19	-	-19	29.300	-29.319	-29.396
Til intern revision	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	897212	-45	-	-45	-	-45	21.500	-21.545	-21.545
Til intern revision	31033 Diverse nedrivning Nuuk	897212	8	-	8	-	8	12.300	-12.292	-12.292
Til intern revision	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	897212	1.016	-1.000	16	-	16	6.800	-6.784	-6.784
Til intern revision	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	897212	124	-	124	-	124	2.900	-2.776	-2.776
Til intern revision	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	4.070	-4.100	-30	-	-30	78.300	-78.330	-78.330
Til intern revision	31049 Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	897212	-656	700	44	-	44	11.800	-11.756	-11.756
Til intern revision	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	897212	2.382	-2.400	-18	-	-18	14.300	-14.318	-15.788
Til intern revision	31051 Renovering af altaner, Paamiut	897212	469	-	469	-	469	11.400	-10.931	-10.931
Til intern revision	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	897212	2.633	-2.600	33	-	33	17.200	-17.167	-17.167
Til intern revision	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	897212	2.604	-2.600	4	-	4	12.400	-12.396	-12.396
Til intern revision	31065 Renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk	897212	-1.762	1.800	38	-	38	18.200	-18.162	-18.452
Til intern revision	31066 Fornyelse af installationer i flere byer	897212	-2.294	-800	-3.094	3.061	-32	44.400	-44.432	-44.432
Til intern revision	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	897212	12.033	-12.000	33	-	33	14.700	-14.667	-14.667
Til intern revision	32140 Ungdomsboliger - typehus	897212	160	-	160	-	160	2.300	-2.140	-2.140
Til intern revision	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	897212	340	-	340	-	340	16.100	-15.760	-15.760
Til intern revision	39041 Genhusning efter oversvømmelse	897212	-29.392	29.400	8	-	8	110.954	-110.946	-110.946
Til intern revision	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	897212	432	-	432	-	432	23.100	-22.668	-22.668
Lukket	10019 Udvidelse af Landstingsaal	011014	-75	-3.379	-3.454	3.454	-	-	-	-3.454
Lukket	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	833012	-19	-18.000	-18.019	18.019	-	-	-	-18.019
Lukket	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	833014	192	-3.900	-3.708	3.708	-	-	-	-3.708
Lukket	46023 Energioptimering DIH, Nuuk	866001	0	-7.000	-7.000	7.000	-	-	-	-7.000
Lukket	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	866001	215	-6.000	-5.786	5.786	-	-	-	-5.786
Lukket	46037 Tilskud til Neriuffik	866001	-34	-1.500	-1.534	1.534	-	-	-	-1.534
Lukket	47055 Diverse nyanlæg og renovering	866001	4	-150	-146	146	-	-	-	-146
Lukket	35026 Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	877222	-6.236	-	-6.236	-	-6.236	18	-6.254	-6.254
Lukket	24122 Sektorplaner for havne	877312	-0	-100	-100	100	-	-	-	-100
Lukket	24128 Diverse nyanlæg	877312	18	-222	-204	204	-	-	-	-204
Lukket	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	877322	-84	-27.075	-27.160	27.160	-	-	-	-27.160
Lukket	25207 Helikopterflyvepladser	877322	102	-5.000	-4.898	4.898	-	-	-	-4.898

Projektstadiet	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilning	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilning t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
Lukket	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	877322	34	-5.900	-5.866	5.866	-	-	-	-5.866
Lukket	25214 Hangar til Tasiilaq	877322	5	-29.300	-29.295	29.295	-	-	-	-29.295
Lukket	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq	877322	54	-6.800	-6.746	6.746	-	-	-	-6.746
Lukket	17780 Udlån til Nukissiorfiit, 2023	897140	-	-60.000	-60.000	60.000	-	-	-	-
Lukket	17781 Udlån til Nukissiorfiit, 2024	897140	-	-60.000	-60.000	60.000	-	-	-	-
Lukket	31042 Diverse nedrivning Qasigiannuit	897212	-34	-3.700	-3.734	3.734	-	-	-	-3.734
Lukket	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	897212	-67	-100	-167	167	-	-	-	-167
Lukket	31068 Lejeboliger, Upernavik	897212	1.500	-1.500	-	-	-	-	-	-
Lukket	31069 Lejeboliger, Uummanaq	897212	1.500	-1.500	-	-	-	-	-	-
Igangværende	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	011015	1.932	-	1.932	-	1.932	6.000	-4.068	-4.296
Igangværende	80800 Omrokeringsreserve	800001	4.051	18.829	22.880	-	22.880	24.456	-1.576	-
Igangværende	52126 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	800002	-	71.500	71.500	-60.676	10.824	71.500	-60.676	-85.601
Igangværende	80801 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	800010	2.513	-	2.513	-	2.513	-	2.513	-
Igangværende	10054 Selvstyrets Central Administration	811002	1.300	-	1.300	-	1.300	1.300	-	-
Igangværende	10058 Ombygning af ASA	811002	-	-	-	11.606	11.606	-	11.606	-
Igangværende	90028 Udvikling af ERP	822002	1.648	2.000	3.648	-1.547	2.101	7.000	-4.899	-7.486
Igangværende	90029 Nyt Lånemodul	822002	3.149	-	3.149	-2.032	1.117	6.500	-5.383	-5.552
Igangværende	40088 Ny Jobportal	822003	334	4.873	5.207	-683	4.524	5.373	-849	-849
Igangværende	40094 Offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse	822003	-365	1.139	774	-774	0	8.739	-8.739	-9.401
Igangværende	90025 Beskæftigelsesfradrag	822401	5.883	-	5.883	-5.883	-	11.400	-11.400	-11.400
Igangværende	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	822401	2.724	3.800	6.524	-4.514	2.010	23.700	-21.690	-29.632
Igangværende	90027 Krops- og narkoskannere	822401	3.879	-	3.879	-3.232	646	4.000	-3.354	-3.354
Igangværende	10055 Grøn vækst - indbetaling fra EU	823001	-	-	-	50.289	50.289	-	50.289	-
Igangværende	10056 Budgetstøtte - projektoversigt	823001	-13.831	-	-13.831	-24.018	-37.849	-	-37.849	-50.700
Igangværende	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	833012	-460	-	-460	-	-460	-	-460	-460
Igangværende	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	833012	12.400	15.800	28.200	-	28.200	28.200	-	-
Igangværende	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	833012	2.897	-	2.897	-	2.897	16.350	-13.453	-15.511
Igangværende	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	833012	3.867	-	3.867	-	3.867	16.400	-12.533	-16.400
Igangværende	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	833012	41.005	-	41.005	-7.667	33.338	42.700	-9.362	-42.700
Igangværende	40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	10.008	21.800	31.808	-19.598	12.210	60.400	-48.190	-48.173
Igangværende	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	3.794	-	3.794	-212	3.582	65.020	-61.438	-61.634
Igangværende	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	833013	23.480	10.600	34.080	-28.318	5.762	47.200	-41.438	-49.262
Igangværende	40091 Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	833013	4.357	-	4.357	-6.684	-2.328	34.500	-36.828	-37.557

Projektstadi	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
Igangværende	15005 Køb af gård i Narsap Ilua	844012	-	8.750	8.750	-	8.750	8.750	-	-
Igangværende	51024 Jern- og Metalskolen i Sisimiut	844012	8.953	-	8.953	-1.716	7.237	10.000	-2.763	-3.455
Igangværende	51026 Landbrugsskole i Upernaviarsuk	844012	2.532	-2.300	232	-	232	700	-468	-796
Igangværende	52100 Skole for selvforsyning	844012	777	-800	-23	-	-23	200	-223	-304
Igangværende	52118 Diverse renovering	844012	14.175	31.200	45.375	-13.765	31.610	124.800	-93.190	-104.488
Igangværende	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	844012	7.066	-	7.066	-3	7.063	8.000	-937	-1.091
Igangværende	52125 Renovering af Kunstsolen i Nuuk	844012	-	1.200	1.200	-123	1.077	1.200	-123	-1.179
Igangværende	52127 Ombygning af landbrugsskolen i Narsaq	844012	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-
Igangværende	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	7.884	-5.738	2.146	-1.476	669	16.562	-15.893	-16.562
Igangværende	54009 Opbevaringsfaciliteter til Grønlands Museum og Arkiv	844014	-	800	800	-800	-	800	-800	-
Igangværende	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassarsuk	844015	4.081	-	4.081	-238	3.843	20.700	-16.857	-21.049
Igangværende	52102 Projektering af standardkollegier	844015	4.149	-	4.149	-300	3.849	7.100	-3.251	-3.251
Igangværende	52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	3.967	-	3.967	283	4.250	56.100	-51.850	-53.232
Igangværende	52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	4.346	-	4.346	-132	4.214	59.900	-55.686	-56.920
Igangværende	52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	6.024	-	6.024	-3.029	2.995	87.850	-84.855	-85.802
Igangværende	52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	-45.603	25.000	-20.603	-2.096	-22.698	216.500	-239.198	-240.226
Igangværende	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	-2.958	-	-2.958	-223	-3.181	66.950	-70.131	-70.980
Igangværende	52120 Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2	844015	3.857	5.200	9.057	-8.211	846	27.900	-27.054	-27.201
Igangværende	52121 Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2	844015	5.875	5.200	11.075	-9.868	1.207	27.400	-26.193	-26.424
Igangværende	52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	844015	41.222	20.800	62.022	-38.701	23.321	94.400	-71.079	-89.012
Igangværende	52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	844015	21.630	1.500	23.130	-18.011	5.119	49.600	-44.481	-47.787
Igangværende	46021 Psykiatribygning i Nuuk	866001	12.540	-	12.540	-61.621	-49.081	49.200	-98.281	-134.814
Igangværende	46031 Projektering af ny sengefløj og patienthotel	866001	6.116	-	6.116	-16	6.100	13.000	-6.900	-7.700
Igangværende	46033 Steno Diabetes Center	866001	-43.813	3.000	-40.813	-16.947	-57.760	3.000	-60.760	-117.692
Igangværende	46034 Anskaffelser af ambulancer	866001	3.129	2.500	5.629	-	5.629	15.000	-9.371	-9.371
Igangværende	47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	37.853	10.300	48.153	-38.865	9.288	124.100	-114.812	-116.721
Igangværende	47051 Apparaturpuljen	866001	11.220	13.500	24.720	-13.174	11.545	147.875	-136.330	-136.353
Igangværende	47053 Vedligeholdelseefterslæb	866001	-10.086	29.500	19.414	-25.075	-5.661	223.900	-229.561	-204.486
Igangværende	47061 Sundhedsvæsenets standard indkvartering	866001	1.748	-	1.748	-1.516	233	2.500	-2.267	-2.267
Igangværende	48013 Centralklinik i Nuuk	866001	6.033	-	6.033	-2.518	3.515	9.218	-5.703	-6.927
Igangværende	90030 Nyt EPJ-System	866001	596	16.500	17.096	-3.993	13.102	18.500	-5.398	-7.206
Igangværende	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	870088	2.013	-	2.013	-	2.013	5.000	-2.987	-4.902
Igangværende	29109 Lufthavnsvej i Qaanaaq	870088	3.569	-	3.569	-340	3.229	6.000	-2.771	-4.312

Projektstadi	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
lgangværende	73016 5-års eftersyn	871106	803	500	1.303	-646	657	2.500	-1.843	-1.946
lgangværende	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	3.791	-	3.791	-404	3.386	54.835	-51.449	-54.289
lgangværende	23013 Vækst- og udviklingsanalyse	871109	3.801	-	3.801	-3.178	623	6.000	-5.377	-5.590
lgangværende	20078 DGNB Bæredygtighedscertificeringsordning	871110	2.000	-	2.000	-221	1.779	2.000	-221	-2.000
lgangværende	21001 Køb af B-4275, borekernelager	877002	2.182	-	2.182	-1.741	441	25.200	-24.759	-25.178
lgangværende	97157 Bevaringsværdige bygninger	877213	6.194	-	6.194	-5.932	261	18.000	-17.739	-17.083
lgangværende	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	877222	3.500	-	3.500	-	3.500	3.500	-	-3.500
lgangværende	24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	23.524	24.700	48.224	-15.213	33.010	269.669	-236.659	-247.742
lgangværende	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	877312	2.402	-	2.402	-121	2.281	2.500	-219	-357
lgangværende	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	877312	3.858	93.900	97.758	-79.152	18.605	114.000	-95.395	-106.981
lgangværende	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	877312	4.678	-	4.678	-180	4.498	19.400	-14.902	-16.957
lgangværende	24141 Havnefyrr	877312	1.798	500	2.298	-1.267	1.031	11.400	-10.369	-10.793
lgangværende	25216 Tasiilaq, landingsbane	877320	2.541	-	2.541	-109	2.433	4.000	-1.567	-1.573
lgangværende	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	877320	2.268	-	2.268	-188	2.079	2.900	-821	-827
lgangværende	25218 Anlæggelse af regionale baner	877320	1.500	1.500	3.000	-107	2.893	3.000	-107	-107
lgangværende	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	-2.240	5.000	2.760	-2.720	40	225.000	-224.960	-224.960
lgangværende	21078 Drikkevandsforsyning, Ilulissat	897140	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	-
lgangværende	17782 Udlån til Nukissiorfiit, 2025	897140	-	60.000	60.000	-60.000	-	60.000	-60.000	-
lgangværende	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	5.844	-	5.844	-1.851	3.993	56.900	-52.907	-53.866
lgangværende	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	897212	288	-	288	-46	242	1.200	-958	-1.007
lgangværende	31031 Diverse nedrivning Narsaq	897212	5.017	-	5.017	-121	4.896	16.000	-11.104	-11.351
lgangværende	31032 Diverse nedrivning Paamiut	897212	11.815	5.000	16.815	-17.706	-890	42.900	-43.790	-43.002
lgangværende	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	897212	3.452	-	3.452	-258	3.194	27.400	-24.206	-24.352
lgangværende	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	897212	1.770	-	1.770	-	1.770	6.094	-4.324	-4.324
lgangværende	31037 Skimmel renovering	897212	-507	8.000	7.493	-10.079	-2.586	85.200	-87.786	-93.676
lgangværende	31043 Landsdækkende skimmelrenovering	897212	6.171	1.000	7.171	-241	6.930	36.000	-29.070	-31.950
lgangværende	31058 Skimmel renovering, Qaqortoq	897212	-2.654	1.500	-1.154	-465	-1.620	8.500	-10.120	-10.209
lgangværende	31059 Skimmel renovering, Maniitsoq	897212	2.591	1.500	4.091	-147	3.945	8.500	-4.555	-4.689
lgangværende	31060 Skimmel renovering, Sisimiut	897212	10.641	7.000	17.641	-6.026	11.615	31.000	-19.385	-21.717
lgangværende	31062 Skimmel renovering, Aasiaat	897212	4.364	1.000	5.364	-121	5.243	5.500	-257	-395
lgangværende	31063 Skimmel renovering, Ilulissat	897212	4.812	-	4.812	-121	4.690	5.000	-310	-447
lgangværende	31064 Nedrivning af BSU-huse	897212	3.824	-	3.824	-597	3.227	8.200	-4.973	-5.045
lgangværende	32124 Boliger	897212	5.190	200	5.390	-42	5.348	32.340	-26.992	-27.650

Projektstadi	Projekt	Finanslov	Primo	Årets bevilling	Disponibel	Årets forbrug	Ultimo	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m indeværende år	Total disponeret
Igangværende	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	897212	17.913	-	17.913	-	17.913	18.000	-87	-87
Igangværende	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	897212	201	500	701	-273	428	17.333	-16.905	-19.276
Igangværende	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	897212	723	200	923	-69	855	10.133	-9.278	-9.766
Igangværende	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit	897212	1.169	800	1.969	-1.789	180	8.933	-8.753	-9.038
Igangværende	32145 Ungdomsboliger, Uummannaq	897212	5.686	-	5.686	-4.408	1.277	18.333	-17.056	-17.293
Igangværende	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	897212	1.562	-	1.562	-950	612	17.134	-16.522	-16.874
Igangværende	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit	897212	2.320	1.200	3.520	-1.424	2.097	11.234	-9.137	-10.209
Igangværende	32149 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq	897212	1.246	5.300	6.546	-4.877	1.669	10.200	-8.531	-9.917
Igangværende	32150 Ungdomsboliger, Nanortalik	897212	5.363	3.400	8.763	-4.880	3.884	10.000	-6.116	-9.798
Igangværende	32151 Ungdomsboliger, Nuussuaq	897212	3.588	300	3.888	-2.667	1.221	5.100	-3.879	-5.090
Igangværende	32152 Ungdomsboliger, Kangaamiut	897212	1.148	-	1.148	-59	1.088	1.500	-412	-548
Igangværende	32153 Ungdomsboliger, Tasiilaq Etape 2	897212	1.282	-	1.282	-78	1.203	1.300	-97	-97
Igangværende	32154 Ungdomsboliger, Narsaq	897212	5.999	3.300	9.299	-6.778	2.521	10.000	-7.479	-9.802
Igangværende	32155 Ungdomsboliger, Upernavik Etape 2	897212	3.889	2.100	5.989	-5.772	216	7.600	-7.384	-7.574
Igangværende	32157 Lejeboliger, Qaanaaq	897212	1.764	3.700	5.464	-3.481	1.983	11.100	-9.117	-11.120
Igangværende	32158 Lejeboliger, Upernavik	897212	1.048	2.800	3.848	-1.565	2.283	4.300	-2.017	-8.258
Igangværende	32159 Lejeboliger, Uummannaq	897212	420	1.500	1.920	-2.738	-818	3.000	-3.818	-8.039
Igangværende	32160 Ungdomsboliger, Kullorsuaq	897212	-24	3.000	2.977	-1.580	1.397	3.000	-1.603	-2.694
Igangværende	32161 Ungdomsboliger, Sarfannguit	897212	-22	1.300	1.279	-470	808	1.300	-492	-566
Igangværende	32162 Ungdomsboliger, Paamiut	897212	-19	1.300	1.282	-351	931	1.300	-369	-590
Igangværende	32163 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit Etape 2	897212	-24	4.000	3.977	-2.615	1.361	4.000	-2.639	-4.303
Igangværende	32164 Ungdomsboliger, Narsaq Etape 2	897212	-18	6.100	6.082	-3.879	2.203	6.100	-3.897	-6.257
Igangværende	34527 Diverse renovering og sanering	897212	128.227	-	128.227	-74.255	53.971	534.955	-480.984	-496.555
Igangværende	34530 Renoveringsindsats - Sammen om Sunde Boliger	897212	-	74.200	74.200	-57.027	17.173	74.200	-57.027	-79.030
Igangværende	38019 Udvikling af Illorput 2023	897212	508	-	508	-80	428	2.000	-1.572	-1.637
I alt			596.040	338.811	934.851	-505.370	429.481	5.009.008	-4.579.527	-5.047.457

Bilag 3 Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden

Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

(Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

Kapitel 4

Finanslov, årsbudget m.v.

Anlæg, renovering m.v.

” **§ 14.** Anlægs- og renoveringsfonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen.

Stk. 2. I Anlægs- og renoveringsfonden indtægtsføres finanslovens anlægsbevillinger. Dette gælder også anlægsbevillinger, som senere er godkendt af Inatsisartuts finansudvalg, og bevillinger, som måtte være afsat i medfør af § 13, stk. 4.

Stk. 3. Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i Anlægs- og renoveringsfonden.

Stk. 4. Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og renoveringsfonden.

Stk. 5. Mindreudgifter på det enkelte anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til Landskassen, når projektet er afsluttet.

§ 15. Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, fastsætter budget- og bevillingsmæssige bestemmelser for Anlægs- og renoveringsfondens virksomhed.

§ 16. Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, forestår den løbende administration af Anlægs- og renoveringsfonden.

§ 17. Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om Anlægs- og renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

Stk. 2. Redegørelsen opdeles på projektyper og projektgrupper og således, at der skelnes mellem bevillinger afsat til nyanskaffelse og bevillinger til vedligeholdelse og renovering.”
